

**ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์**

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๕๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๓๘๖,๙๙๓.๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๗

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

(๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ งานประสานงานเพื่อสนับสนุน ข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

(๒.๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๙๐๖,๘๑๓.๒๓ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๒๖,๗๐๓.๓๑ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๕,๕๖๗.๗๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๖๐๔,๕๔๒.๒๒ ไร่

(๒.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



หน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าที่ นว.๑ (แม่กะสี)
ออกลาดตระเวน พื้นที่ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์



หน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าที่ อน.๘ (บ้าน กม.๕๓)
ออกลาดตระเวน พื้นที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

๒. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานการคัดเลือกผู้นำโครงการ และประชุมผู้นำโครงการ งานจัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และงานจัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและคณะทำงานระดับตำบล อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนงานประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ งานนำผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ทัศนศึกษา งานคณะทำงานระดับตำบล สำนักรวเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล งานสรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่า และพืชเกษตร งานประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่น ๆ งานจัดหาพันธุ์ไม้ งานจัดทำแผนการปลูกและการปลูกพืช งานส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม และจดทะเบียนกลุ่มกับทางราชการ และงานการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ส่งผลให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

แนวทางแก้ไข : ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประสานงาน เช่น โทรศัพท์มือถือ และแอปพลิเคชันไลน์

(๔) รูปภาพประกอบการทำงาน



ประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ระดับอำเภอ ของโครงการส.ส.ร. อำเภอย้ายคต จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ ๑ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอย้ายคต



ประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ระดับอำเภอ ของโครงการส.ส.ร. อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ ๑ และพื้นที่ ๒ ณ โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ ฯ ตำบลแก่งมะกรูด อำเภอบ้านไร่



ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ของโครงการส.ส.ร. อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ ๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยขาแข้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี



รับสมัครเข้าร่วมโครงการ ของโครงการส.ส.ร. อำเภอย้ายคต จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ ๑ ณ ศาลาประชาคมชุมชนกระเหรี่ยงบ้านภูเหม็น อำเภอย้ายคต จังหวัดอุทัยธานี

๓. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๔๔,๙๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๕

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

(๒.๑) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๒) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๒.๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๘๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๗ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๗๗ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓ ไร่ สำหรับงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และงานจัดทำทะเบียนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๗ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓ ไร่

(๒.๒.๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๘๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งได้รับพื้นที่ เป้าหมายให้ดำเนินการ รวมจำนวน ๑๕๗ ไร่ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการ ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จได้เพียง ๗๗ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๖๓ เมื่อนำมา เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า ในขณะที่มี ผลการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๑๑๘,๔๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๕ สะท้อนให้เห็นว่า ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงินไม่สอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ได้ชี้แจงกับสำนักแผนงานและสารสนเทศว่า ผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าวได้เบิกจ่ายเงินออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและเพื่อเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ทว่าผู้ปฏิบัติยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะหากหน่วยปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายเงินออกจากระบบก่อนที่จะดำเนินการ แล้วเสร็จ ย่อมส่งผลกระทบต่อภาระงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำลังทำ หรือตรวจสอบจากภายนอก นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดในภาพรวมของกรมป่าไม้อีกด้วย

(๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ท้องที่ตำบลปางสวรรค์ อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่
หมู่ที่ ๒๒ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่
หมู่ที่ ๔ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

๔. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๓๙๐,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒,๓๖๓,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๕

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

(๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วเสร็จ ๕๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๔๕๐ ไร่ สำหรับงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๔๕๐ ไร่

(๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๓) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๕๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๔) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๖๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๕) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๔ มีเป้าหมาย ๔๗๙ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๖) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๕๙๔ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๗) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๘) งานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ท้องที่ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครสวรรค์



ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ท้องที่ตำบลจันทน์เสน อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่
ท้องที่หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองกระโดน
อำเภอมะนัง จังหวัดนครสวรรค์



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่
ท้องที่หมู่ที่ ๓ ตำบลทับกฤชใต้
อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครสวรรค์

๕. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗๘,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๒๕,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๑,๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗

(๒.๑) งานจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ มีเป้าหมาย ๓ ป่า โดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒.๒) งานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๓ ป่า โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ป่า และยังไม่ดำเนินการ ๒ ป่า

(๒.๓) งานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรโดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และดำเนินการสำรวจ-รังวัดแปลงที่ดินของราษฎร มีเป้าหมาย ๑,๕๐๐ ไร่ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๐๐๐ ไร่

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



เจ้าหน้าที่นำแผนกำหนดการสำรวจประสานผู้นำชุมชน ก่อนประชุมชี้แจงราษฎร ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าแม่วงศ์-แม่เป็น ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์




ประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วม ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าแม่วงศ์-แม่เป็น ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์



เจ้าหน้าที่รับแจ้งสำรวจรายชื่อราษฎรที่ทำกิน ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าแม่วงศ์-แม่เป็น ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์



เจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบขอบเขตและรังวัด แปลงที่ดินราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าแม่วงศ์-แม่เป็น ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

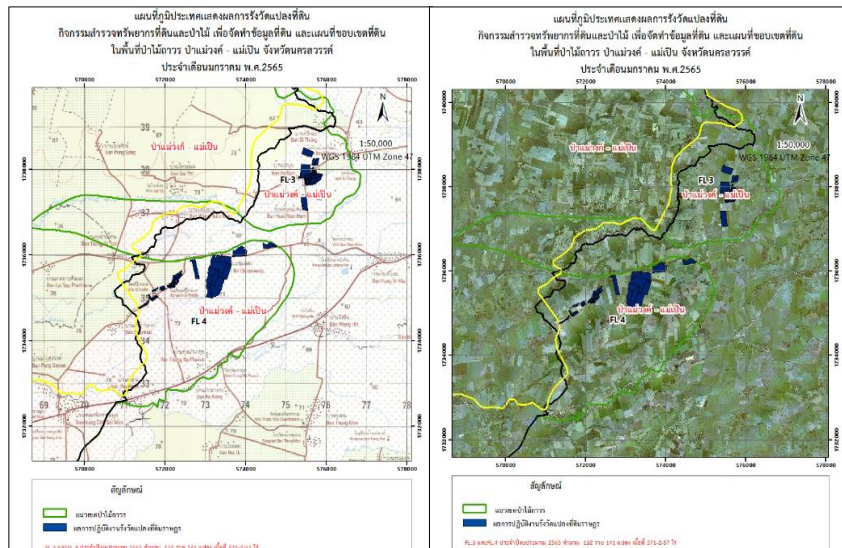

แผนที่ผังแปลงรวมที่ดินราษฎร

๖. กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๓๘๘,๔๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๒๐,๔๑๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๐

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๗๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๔ โดยได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๖๐ หมู่บ้าน ส่วนงานสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และงานรวบรวม และจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๖๐ หมู่บ้าน

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



กำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินงานโดยการจัดทำแผนที่ และประสานเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านไร่



ประสานผู้นำชุมชน การถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยท่ากวย และป่าห้วยกระเวนในท้องที่ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี



จัดประชุมชี้แจงราษฎร ในการสำรวจการถือครองที่ดิน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยท่ากวย และป่าห้วยกระเวน ในท้องที่บ้านใหม่ร่มเย็น ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี



เจ้าหน้าที่วางแผนร่วมกับราษฎร ในการสำรวจการถือครองที่ดิน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยท่ากวย และป่าห้วยกระเวน ในท้องที่บ้านอิพุงใหญ่ ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี



เจ้าหน้าที่สำรวจการถือครองแปลงที่ดินราษฎร ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยท่ากวย และป่าห้วยกระเวน ในท้องที่บ้านเขาน้อย ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี



ราษฎรถือครองแปลงที่ดินราษฎร ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยท่ากวย และป่าห้วยกระเวน ในท้องที่บ้านบุง ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

๗. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๕๑,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๑๘,๙๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๒

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๒๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินสภาพทรัพยากรที่ดิน และป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ ๔ กลุ่ม ทำการตรวจสอบในพื้นที่จริงและถ่ายทอดขอบเขตลงในแผนที่วางแผนดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของราษฎร และงานจัดทำร่างแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เสนอกรมป่าไม้ อนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำ มาตรการลงสู่การปฏิบัติ และงานสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร/จัดระเบียบการใช้ที่ดินตามโครงการ จัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ ยังไม่ดำเนินการ

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประธานผู้นำชุมชนจัดทำขอบเขตหมู่บ้าน
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่वंก-แม่เป็น
อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์



ประธานผู้นำชุมชนจัดทำขอบเขตหมู่บ้าน
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง และป่าเขาซอยดว
อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์



เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบขอบเขตหมู่บ้าน
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเจ็ดยักษ์ ป่าตะพานผา และป่าเขาหอม
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร



เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบขอบเขตหมู่บ้าน
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาทราย และป่าเขาพระ
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๘. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๔๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๒๒,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๑

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

(๒.๑) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๔ หมู่บ้าน โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒.๒) งานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๔๐๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๐ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๓๐๐ กิโลเมตร


(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



การจัดทำแนวกันไฟ ท้องที่อำเภอมะเณป
จังหวัดนครสวรรค์



การจัดทำแนวกันไฟ ท้องที่อำเภอไพศาล
จังหวัดนครสวรรค์

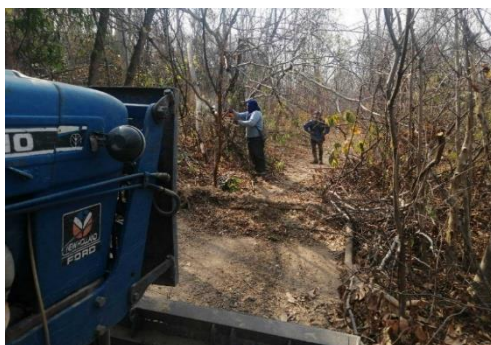

การจัดทำแนวกันไฟ ท้องที่อำเภอไพศาล
จังหวัดนครสวรรค์



การจัดทำแนวกันไฟ ท้องที่อำเภอแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์

๙. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๓๗๓,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๑๒,๕๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๕

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

(๒.๑) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐ โดยได้ดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน

งานจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และงานยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๒.๒) การจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๖๕ กิโลเมตร/ ๑,๓๒๕ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๔ โดยได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชนแล้วเสร็จ ๕๐ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๓๕ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๔๐ กิโลเมตร สำหรับงานรังวัด แนวเขตและแบ่งบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๖๕ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๑๐๐ กิโลเมตร และงานจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๖๐ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๑๐๕ กิโลเมตร ส่วนงานจัดทำป้ายป่าชุมชนและงานติดตั้งป้ายป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๓) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓ ป่าชุมชน/ ๑๕ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน สำหรับงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ งานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ งานการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ และงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตและลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากปริมาณงาน ในพื้นที่มีจำนวนมากเกินเมื่อเทียบกับอัตราส่วนของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนศูนย์ป่าไม้อุทัยธานีและคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนร่วมกันเดินสำรวจพื้นที่บ้านอิพุงใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนศูนย์ป่าไม้อุทัยธานีประชาสัมพันธ์ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชนบ้านน้ำดี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ประชาสัมพันธ
ชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแนวเขต
และการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย
หมู่ที่ ๒๑ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์
แนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนบ้านประจันตคีรี
หมู่ที่ ๖ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์
แนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนบ้านหนองพวา
หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์



สำรวจเพื่อรังวัดแนวเขตป่าชุมชนบ้านเขารวก
หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
