

ผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
 พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นภ.๒ (ศรีบุญเรือง) ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้นำการรายงานผลในภาพรวม และผลการติดตามในพื้นที่มาสรุป ดังนี้

(๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑,๕๒๗,๔๔๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๓,๘๓๓,๓๐๑.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๕

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

(๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

(๒.๒) ออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๔,๔๙๐,๙๓๐.๗๕ ไร่ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๔๙๖,๙๗๖.๙๒ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๗๔,๒๔๔.๒๓ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒,๖๑๙,๗๐๙.๖๐ ไร่

(๒.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการลาดตระเวนประจำเดือนรายงานผลให้ต้นสังกัดทราบแล้วเสร็จ ๓ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๘ เดือน

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากหน่วยงานได้รับงบประมาณไม่เพียงพอกับการกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การออกลาดตระเวนตามแผนที่ต้องมียกงบประมาณในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง โดยเฉพาะค่าพาหนะที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

(๓.๒) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากจำนวนอัตรากำลังของหน่วยป้องกันมีน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบ จึงต้องการพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า และตำแหน่งพิทักษ์ป่า เพื่อให้สอดคล้องกับการกิจในการออกลาดตระเวนตามแผน
 - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดทำแผนที่ (GIS) ควรมีการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป้องกัน ฯ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

- (๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากภารกิจการออกลาดตระเวน ซึ่งมีสภาพการปฏิบัติงานทุรกันดาร ทำให้ยานพาหนะ (รถยนต์) ของหน่วยงานภาคสนามเสื่อมสภาพ ชำรุดเร็ว และควรให้มีการจัดสรรให้ทั่วถึงและเพียงพอ จำนวนรถต่อหน่วยสภาพใช้งาน ได้ดีควรจะมีไม่ต่ำกว่า ๓ คัน/หน่วย
- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดสรรคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อปฏิบัติงานนอกพื้นที่ คอมพิวเตอร์สำนักงานเพื่อใช้ประจำสำนักงาน ให้ส่วนป้องกัน ฯ และหน่วยงานภาคสนาม ซึ่งเดิมมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และอาวุธปืนที่มีสภาพเก่า ชำรุด และไม่เพียงพอ
 - บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เนื่องจากอาคารบ้านพัก และอาคารสำนักงานมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมากใช้งานไม่ได้ ส่งผลต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการสรรสำหรับซ่อมแซมในปีที่ผ่านมาจำนวนจำกัดจัดสรรไม่เพียงพอ

(๔) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- (๔.๑) ควรจัดสรรงบประมาณกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ให้เพียงพอ เช่น การออกลาดตระเวนตามแผนที่ต้องมียงบประมาณในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง โดยเฉพาะค่าพาหนะที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนมาก
- (๔.๒) ควรจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมยานพาหนะของหน่วยป้องกันรักษาป่าให้เพียงพอ
- (๔.๓) ควรจัดสรรครุภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์แบบพกพา
- (๔.๔) ควรจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซม หรือสร้างใหม่ สำหรับอาคารบ้านพัก อาคารสำนักงาน เนื่องจากอาคารบ้านพัก และสำนักงานของหน่วยป้องกันรักษาป่า ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมากใช้งานไม่ได้ ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการซ่อมแซมในปีที่ผ่านมาจำนวนจำกัด ไม่ทั่วถึง
- (๔.๕) ควรจัดสรรอาวุธปืนให้กับหน่วยป้องกันรักษาป่า เนื่องจากมีสภาพเก่า ชำรุด
- (๔.๖) ควรมีการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดทำแผนที่ (GIS) ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป้องกัน ฯ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

- ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ลำดับที่ ๓ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๖) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการให้ข้อมูลของนายเดชา ภูบัวเพชร หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นก.๒ (ศรีบุญเรือง) และการสำรวจสภาพบ้านพักข้าราชการระดับ ๑ - ๒ ของหน่วยป้องกัน ฯ พบว่า โครงสร้างของบ้านพักยังสามารถใช้งานต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ฝ้าเพดานทรุดโทรมมาก ไม่สามารถใช้ป้องกันแสงแดดและลมฝนได้ ในขณะที่กระจกหน้าต่างบางส่วนแตกเสียหาย ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จึงควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงาน สำหรับเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน รายการบ้านพักข้าราชการระดับ ๑ - ๒ จำนวน ๑ หลัง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้ตามปกติ

นอกจากนี้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นก.๒ (ศรีบุญเรือง) ควรจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

(๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(๗.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



วางแผนแนวทางออกลาดตระเวน
ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นก.๒ (ศรีบุญเรือง)
จังหวัดหนองบัวลำภู



ออกลาดตระเวนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง
และป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง
อำเภอโนนน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี



ออกประชาสัมพันธ์ จังหวัดเคลื่อนที่ บ้านไฮตาก
ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย



ประชุมข้อราชการร่วมกับอำเภอ
และหัวหน้าส่วนราชการ
ในพื้นที่อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

(๗.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ



สภาพอาคารสำนักงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นภ.๒ (ศรีบุญเรือง)
ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู



สภาพอาคารบ้านพักของข้าราชการระดับ ๑ - ๒ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นภ.๒ (ศรีบุญเรือง)
ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

๒. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ป่าชุมชนบ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๒ ตำบลนาจ้ว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โดยได้นำการรายงานผลในภาพรวม และผลการติดตามในพื้นที่มาสรุป ดังนี้

(๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๔๗๔,๑๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีการใช้จ่ายเงิน

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

(๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๔๗ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๑ โดยอยู่ระหว่างดำเนินงานแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และงานจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ ๑๔ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๓๓ ป่าชุมชน สำหรับงานยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนยังไม่ดำเนินการ

(๒.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๔๗ ป่าชุมชน/๙๖ กิโลเมตร ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๘๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔.๖๙ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ๑ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๖ เดือน สำหรับงานการจัดหาป้ายป่าชุมชน งานการจัดหาหลักเขตป่าชุมชน และงานการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเนื่องจากศูนย์ป่าไม้ในความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ได้แก่ ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ศูนย์ป่าไม้เลย และศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ มีรถยนต์ราชการไม่เพียงพอที่จะใช้ในงานปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน

(๔) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

(๔.๑) กรมป่าไม้ ควรจัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

(๔.๒) ควรสนับสนุนรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ในการปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนเพิ่มเติม

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

- ลำดับที่ ๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ๓ ไม่มี

(๖) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานจัดตั้งป่าชุมชน งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน และงานส่งเสริมจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน พบว่า กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕.๔๕ ประกอบกับยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าการปฏิบัติงานมีความล่าช้าค่อนข้างมาก ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชน ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ในฐานะหน่วยงานเบิกจ่าย จึงต้องเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

(๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(๗.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



การให้คำแนะนำคณะกรรมการป่าชุมชน
ในการจัดตั้งป่าชุมชนท้องที่จังหวัดอุดรธานี



การประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ ให้คำแนะนำ
คณะกรรมการป่าชุมชนในการจัดตั้งป่าชุมชน
ท้องที่จังหวัดบึงกาฬ



การลงพื้นที่สำรวจป่าชุมชนเพื่อการจัดตั้งป่าชุมชน
ท้องที่จังหวัดอุดรธานี



การลงพื้นที่สำรวจป่าชุมชนเพื่อการจัดตั้งป่าชุมชน
ท้องที่จังหวัดบึงกาฬ

(๗.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ



ลงพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๒ ตำบลนาจ้ว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

๓. กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ หมู่บ้านวังบง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี โดยได้นำการรายงานผลในภาพรวม และผลการติดตามในพื้นที่มาสรุป ดังนี้

(๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙,๒๗๗,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๕๐,๖๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๔

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๕๖๕ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๓ โดยได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน และงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒๐ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๔๔๕ หมู่บ้าน ส่วนงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๐ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๕๐๕ หมู่บ้าน

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า ทำให้ไม่สามารถจ้างเจ้าหน้าที่ GIS และผู้ช่วย GIS ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานเป็นอย่างมาก

(๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในขณะปฏิบัติงาน จึงต้องการขอรับการสนับสนุนรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม

- ครูภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในขณะปฏิบัติงาน จึงต้องการขอรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เพิ่มเติม

(๔) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ขอรับการสนับสนุนรถยนต์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า

ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ครูภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๖) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

(๖.๑) ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ได้รายงานถึงปัญหาด้านบุคลากรว่า มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สืบเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการมาปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จึงควรนำประเด็นดังกล่าวหารือกับสำนักบริหารกลางและ/หรือกลุ่มตรวจสอบภายใน ในการจ้างเหมาบริการต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(๖.๒) สำนักจัดการที่ดินป่าไม้จัดส่งแผนที่ดิจิทัล ในรูปแบบ Shapefile ให้หน่วยปฏิบัติ เพื่อดำเนินงานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการรังวัดในพื้นที่จริง พบว่ามีความคลาดเคลื่อนจากแผนที่ โดยมีพื้นที่ล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่แปลง คทช. นอกจากนี้ ยังพบว่า ในพื้นที่แปลง คทช. ดังกล่าว เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหลักเขตที่ดินแล้ว แต่กลับไม่พบการปักหลักเขตที่ดิน ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จึงควรตรวจสอบในประเด็นดังกล่าว เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ลงพื้นที่ติดตาม
ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานโครงการ ฯ
ณ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำโสม



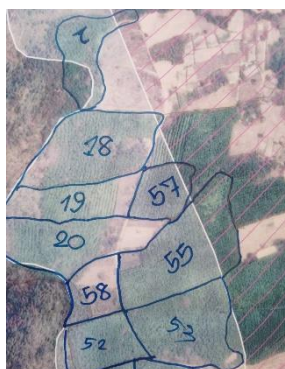
เจ้าหน้าที่หน่วยและผู้ช่วยงาน GIS ลงพื้นที่อธิบาย
รายละเอียดโครงการ และสำรวจแปลงเพิ่มเติม
ณ ศาลาประชาคมบ้านกุดตุ้มเหนือ หมู่ที่ ๑
ตำบลกุดตุ้ม อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู



เจ้าหน้าที่หน่วยและผู้ช่วยงานสำรวจลงพื้นที่
สำรวจแปลงเพิ่มเติม ที่้องที่บ้านท่าสำราญ หมู่ที่ ๗
ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี



เจ้าหน้าที่หน่วยและผู้ช่วยงาน GIS ลงพื้นที่อธิบาย
รายละเอียดโครงการ และสำรวจแปลงเพิ่มเติม
ที่้องที่บ้านดงบาก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมพัฒนา
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

[illegible][illegible]

ข้อมูลแปลง/พิกัด ของชาวบ้านเพื่อนำไปประกอบกับแผนที่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

๑. กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า และดำเนินงานจัดทำแนวกั้นไฟ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ บ้านหนองเลาใหญ่ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยได้นำการรายงานผลในภาพรวม และผลการติดตามในพื้นที่มาสรุป ดังนี้

(๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๕๒๘,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕๗๘,๖๓๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๖

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

- (๒.๑) งานเสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๕๓ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๙ โดยหน่วยงานรับผิดชอบ ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ประสานผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำประชาคม พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่าย ฯ และรายงานกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานที่หน่วยงานรับผิดชอบชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินงาน กิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟป่าและรายงานผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๕ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ หมู่บ้าน สำหรับงานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า และงานตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้านเครือข่าย ฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
- (๒.๒) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๕ คน/ปี ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- (๒.๓) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๕๘๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๗๕ กิโลเมตร
- (๒.๔) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๖ ครั้ง/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- (๒.๕) งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ป้องกันไฟป่าให้กับหน่วยงานส่วนราชการ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีเป้าหมาย ๑ ชุด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- (๒.๖) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๖ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

- (๓.๑) ด้านงบประมาณ : การกระจายงบประมาณและปริมาณงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานระดับพื้นที่ โดยขอให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จัดสรรงบประมาณการจัดทำแนวกันไฟ และงบดำเนินงานเพิ่มเติม ให้แก่หน่วยป้องกันรักษาป่า เพื่อการให้ปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในความรับผิดชอบ
- (๓.๒) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากข้าราชการ พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า พนักงานพิทักษ์ป่า ไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงานหน่วยป้องกันรักษาป่า เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน ปัจจุบันใช้รถยนต์ราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า ซึ่งต้องใช้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เป็นหลักด้วย โดยรถยนต์ราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า มีจำนวนรวม ๒๖ คัน ต้องการรถยนต์กระบะสี่ล้อ แบบมี cab เพิ่มอีกจำนวน ๒๖ คัน ปัจจุบันใช้ในภารกิจต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ ได้แก่ กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) งานจัดการป่าชุมชน งานส่งเสริมการปลูกป่า ฯ

(๔) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- (๔.๑) ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทำแนวกันไฟของหน่วยป้องกันรักษาป่า ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
- (๔.๒) จัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน ให้แก่หน่วยป้องกันรักษาป่า ได้แก่ งบดำเนินงานประสานงานเครือข่าย ฯ ค่าน้ำมัน ยานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน
- (๔.๓) จัดสรรยานพาหนะเพิ่มเติมให้แก่หน่วยป้องกันรักษาป่า
- (๔.๔) อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ในการป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน เพื่อถ่ายทอดให้แก่เครือข่ายควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบ

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

- ลำดับที่ ๑ การกระจายงบประมาณและปริมาณงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดับพื้นที่
- ลำดับที่ ๒ จำนวนอัตรากำลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
- ลำดับที่ ๓ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

- (๖.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า
บ้านหนองเลาใหญ่ ตำบลมะเกลือเก่า
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา



การปฏิบัติงานดับไฟฟ้าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดงกระสัง ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า
ร่วมกับเครือข่าย ฯ



เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า
บ้านเขาวงพระจันทร์ อำเภอสทิงพระ
จังหวัดชัยภูมิ



กิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟและลดปริมาณเชื้อเพลิง
เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า
บ้านเขาวงพระจันทร์

(๖.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ



ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า
และดำเนินงานจัดทำแนวกันไฟ ณ บ้านหนองเลาใหญ่ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา

๒. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ บ้านหัวสะพาน ตำบลทุ่งอรุณ และบ้านบึงไทย ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยได้นำการรายงานผลในภาพรวม และผลการติดตามในพื้นที่มาสรุป ดังนี้

(๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๐๐๐,๖๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีการใช้จ่ายเงิน

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

- (๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๘๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๓ โดยได้ดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ และงานรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๑๗๗ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๒๓ ไร่ ส่วนงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วเสร็จ ๑๗๗ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๕๘๓ ไร่ สำหรับงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๗๗ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๖๒๓ ไร่
- (๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๑๖ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการให้คำแนะนำทางวิชาการ ด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดแล้วเสร็จ ๔ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๒ ไร่
- (๒.๓) งานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๘๐๐ ไร่ งานค่าใช้จ่าย ในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๘๐๐ ไร่ งานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๔ มีเป้าหมาย ๙๘๑ ไร่ งานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูก ไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๗๙๔ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ งานสำรวจความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และงานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๑๘ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

- (๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินงาน มีหลายขั้นตอน ตั้งแต่การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบพื้นที่ ให้คำแนะนำ ทางวิชาการ ตรวจสอบรับรองผลและติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งใน การลงพื้นที่ในแต่ละแปลงของเกษตรกรแต่ละราย มีการลงพื้นที่ประมาณ ๓ - ๔ ครั้ง และทุกครั้งที่ลงพื้นที่จะมีค่าใช้จ่ายในการลงไปปฏิบัติงาน งบประมาณที่ให้มีจึงไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
- (๓.๒) ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ด้านส่งเสริมการปลูกป่าที่จะไปส่งเสริมเกษตรกรให้เกิดความเชื่อมั่นและ หันมาปลูกป่า
- (๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่มีความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ มีรถยนต์ประจำ ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ มีจำนวน ๒ คัน ๑. ชว ๑๒๖๐ กทม. มีอายุการใช้งาน ๑๖ ปี ๒. บจ ๑๘๐๗ ชัยภูมิ มีอายุการใช้งาน ๒๖ ปี และรถยนต์ที่มีความต้องการที่จะใช้ในการออกพื้นที่ คือรถกระบะบรรทุก ขับเคลื่อน ๔ ล้อ น้ำหนัก ๑ ตัน ๔ สูบ กระบอสูบ ๓,๐๐๐ ซีซี

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

(๔.๑) การกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ และการปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย กรณีเกษตรกรเสียชีวิต ตามระเบียบ จะต้องให้ออนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เข้าร่วมโครงการก่อน ถึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการต่อได้ ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ จะถือว่าสิ้นสุดโครงการด้วยเหตุสุดวิสัย

แนวทางแก้ไข : ควรแก้ไขระเบียบเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของผู้รับผลประโยชน์ ที่จะเข้าร่วมโครงการต่อ เพื่อให้ผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ตามเอกสารคำขอ เข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมโครงการต่อเนื่องได้เลย โดยไม่ต้องโอน กรรมสิทธิ์ในที่ดิน

(๔.๒) การสนับสนุนเงินอุดหนุน ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท น้อยเกินไป ประกอบกับไม่มีกล้าไม้สนับสนุน ตามโครงการ จึงทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความลำบากในการจัดหากล้าไม้มาปลูก ส่งผลให้มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการน้อยลง

แนวทางแก้ไข : เพิ่มจำนวนเงินที่สนับสนุนและควรมีการสนับสนุนกล้าไม้ตามโครงการนี้ด้วย

(๔.๓) ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการเพียง ๑ ปี ซึ่งเป็นโครงการระยะสั้น เมื่อจบโครงการแล้ว เกษตรกรอาจเปลี่ยนใจ นำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

แนวทางแก้ไข : ควรเพิ่มระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการจาก ๑ ปี เป็น ๓ - ๕ ปี เพื่อให้โครงการ เกิดผลสำเร็จมากที่สุด

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๖) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ได้รายงาน ถึงปัญหาในแนวทางปฏิบัติที่กรมป่าไม้กำหนด ไม่มีการสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในขณะที่เกษตรกรจำนวนมากมีความประสงค์ให้กรมป่าไม้สนับสนุนกล้าไม้ ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จึงควรหารือ/ประสานขอความอนุเคราะห์ให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

(๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(๗.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์และ
รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ท้องที่ตำบลปราสาท
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์



เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์และ
รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ท้องที่ตำบลนายางหลัก
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ



เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า จังหวัดนครราชสีมา
ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบสภาพความเหมาะสมของ
พื้นที่ และให้คำแนะนำทางด้านการปลูกและบำรุง
ต้นไม้แก่เกษตรกร ท้องที่ตำบลท่าลาด
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ ลงพื้นที่สำรวจ
ตรวจสอบสภาพความเหมาะสมของพื้นที่และ
ให้คำแนะนำทางด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้
แก่เกษตรกร ท้องที่ตำบลนายางหลัก
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

(๗.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ





ลงพื้นที่กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ เกษตรกร รายที่ ๑ บ้านหัวสะพาน ตำบลทุ่งอรุณ และเกษตรกร รายที่ ๒ บ้านบึงไทย ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

๓. กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางหลักที่ ๒ จังหวัดชัยภูมิ ท้องที่บ้านทับนายและบ้านกระจาน ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยได้นำการรายงานผลในภาพรวม และผลการติดตามในพื้นที่มาสรุป ดังนี้

(๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๔๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๘๙๒,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๒

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

งานปลูกป่าทั่วไป มีเป้าหมาย ๘๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ งานการทำทางตรวจการ และงานการทำแนวกันไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานการถาง และงานการเก็บ ริม สุ่ม เผา งานการทำหลัก และปักหมุดแนว งานการปลูกและการขนกล้า งานการตายวัชพืชหลังปลูก และงานการปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : - งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก

๑. อัตราราคาต่อหน่วยสำหรับงานปลูกป่า มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าแรงงาน ประมาณร้อยละ ๗๕ ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ หลายกิจกรรม เช่น การสำรวจและรังวัดแนวเขต การถาง การเก็บ ริม สุ่ม เผา ทำทางตรวจการ ทำแนวกันไฟ ฯลฯ และเมื่อเทียบกับ ราคาค่าแรงในแต่ละพื้นที่แล้ว ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในพื้นที่ ทั้งหมด ทำให้การดำเนินงานล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ทัน ฤดูกาล
๒. อัตราราคาต่อหน่วยสำหรับงานปลูกป่า มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่ากล้าไม้/เมล็ดพันธุ์ ประมาณร้อยละ ๑๕ ซึ่งไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับราคากล้าไม้/เมล็ดพันธุ์ไม่มีค่าแต่ละชนิด เพราะไม่มีค่าแต่ละชนิด มีราคาที่แตกต่างกัน ตามความยากง่ายของการจัดเตรียม

- หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดทำป้ายแปลงปลูกป่าตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานฟื้นฟูป่าไม้ ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่าที่กำหนดให้มีการจัดทำป้ายประจำแปลงฟื้นฟูป่าไม้

- (๓.๒) ด้านบุคลากร :
- การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกรายการ หรือเสียชีวิต เนื่องจากหน่วยฟื้นฟู ๑ แต่ละหน่วยจะมีหัวหน้าซึ่งเป็นข้าราชการประจำแปลงเพียงคนเดียว หากเกิดกรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก หรือเสียชีวิต จะเป็นอุปสรรคต่อผู้ที่เข้าไปดำเนินการต่อ เพราะแปลงปลูกป่า ๑ แปลง จะมีการปลูกบำรุงต่อเนื่องไปจนถึงปีที่ ๑๐ หากไม่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนงานหรือประสานงานของหน่วย ๑ จะทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานได้
 - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดการอบรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับความรู้ และ/หรืองานวิจัยใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการปลูกและบำรุงป่า ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนโดยรอบพื้นที่

- (๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการตรวจติดตามการดำเนินงานในแปลงปลูก รวมถึงช่วงฤดูไฟป่าที่ต้องมีตรวจตราและเฝ้าระวัง

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลต่อการบำรุงดูแลรักษากล้าไม้ก่อนและหลังปลูกฟื้นฟู
แนวทางแก้ไข : กรมป่าไม้ควรจัดสรรงบประมาณสร้างแหล่งน้ำ โดยพิจารณาจากสภาพพื้นที่นั้น ๆ เช่น เจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำในการปลูกบำรุงป่า รวมถึงการดับไฟป่า โดยสามารถดำเนินการได้ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ๑ เพื่อประโยชน์ในการบำรุงดูแลรักษาป่าสงวนแห่งชาติ

(๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- (๕.๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานประจำปี และนำไปปรับปรุงพัฒนาแผนการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูป่า รวมถึงการสร้างมาตรการที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการฟื้นฟูป่าให้กับองค์กร
- (๕.๒) หน่วยฟื้นฟู ๑ ขาดความต่อเนื่องของงบประมาณในการปลูกฟื้นฟู ๑ ในพื้นที่เสื่อมโทรมอื่น ๆ และกรมป่าไม้ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณปลูกบำรุงในแต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึง รวมถึงการลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของพื้นที่ที่ต้องได้รับการฟื้นฟู
- (๕.๓) ควรปรับแก้ลักษณะงานปลูกป่า คือ การถาง การเก็บ ริด สุม เผา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายที่ต้องการให้ลดการเผา โดยเปลี่ยนเป็นกิจกรรมการเตรียมพื้นที่แทน

(๖) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

- ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ลำดับที่ ๒ การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกรายการ หรือเสียชีวิต
- ลำดับที่ ๓ การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง

(๓) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่าของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ และหัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง ๓ หน่วย ได้รายงานถึงปัญหาจากการปฏิบัติการกิจฟื้นฟูพื้นที่ป่า อาทิ ความไม่สอดคล้องกันของอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) ทั้งงานปลูกป่าทั่วไปและงานเพาะชำกล้าไม้ การปรับปรุงแก้ไขข้อความของเนื้อหา/ขั้นตอน การดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จึงควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ระหว่างสำนักส่งเสริมการปลูกป่า และหน่วยปฏิบัติในพื้นที่

(๘) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

(๘.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



การสำรวจและรังวัดแนวเขตของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลักที่ ๒ จังหวัดชัยภูมิ บ้านทับนายและบ้านกระจวน หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ



การสำรวจและรังวัดแนวเขตของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวน หมายเลข ๑๐ ที่ ๑๐ ท้องที่บ้านบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ



การจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวน หมายเลข ๑๐ ที่ ๙ ท้องที่บ้านนาเจริญ ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ



การทำทางตรวจการของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลักที่ ๒ จังหวัดชัยภูมิ บ้านทับนายและบ้านกระจวน หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

(๘.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ



ลงพื้นที่ ณ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ปานายางหลักที่ ๒ จังหวัดชัยภูมิ ท้องที่บ้านทับนาย
และบ้านกระจวน ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
