รายงาน

ความก้าวหน้าโครงการ ๒/๒๕๖๔

โครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ ในประเทศไทย

สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนโดย

กองทุนพิเศษภายใต้กรอบความร่วมมือ แม่โขง-ล้านช้าง

เมษายน –มิถุนายน ๒๕๖๔

รายงาน

ความก้าวหน้าโครงการ

เมษายน –มิถุนายน ๒๕๖๔ (ไตรมาตรที่ ๒/๒๕๖๔)

โครงการสาธิตการบรรเทา ความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย

โดยสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนโดยกองทุนพิเศษภายใต้กรอบความร่วมมือ แม่โขง-ล้านช้าง

๑. บทนำ

โครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย ดำเนินการโครงการโดยสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ซึ่งโครงการนี้มีการดำเนินโครงการตามกรอบข้อตกลง (MOU) เป็นเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ หลังจากมีการลงนามความเข้าใจ ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) แต่ในการดำเนินงานสามารถดำเนินการได้เป็นระยะเวลา ๒ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๓) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ดังนั้นกองทุนพิเศษภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ได้อนุมัติในการขยายเวลาของโครงการเป็นระยะเวลารวม ๓ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๕)

กรมป่าไม้ได้มีการแต่งตั้งกรรมการโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยท่านอธิบดีกรมป่าไม้ และมีการเตรียมการโครงการ โดยมีการพบปะและทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการฯ ได้มีการเริ่มปฏิบัติการจริงในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการโครงการซึ่งมีท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ (ที่กำกับดูแลสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ) เป็นประธานโครงการและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒ ท่าน คือ ผู้จัดการโครงการและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักการป่าไม้ต่างประเทศเป็นหน่วยงานปฏิบัติการ และประสานงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการได้เริ่มการปฏิบัติตั้งแต่พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา และการดำเนินการประเมินสำรวจพื้นที่ในการคัดเลือกพื้นที่นำร่องโครงการ ซึ่งได้คัดเลือกและด้วยความสมัครใจของชุมชนในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 6 ชุมชนหลักเพื่อเน้นการการฟื้นฟูและขยายพื้นที่แนวเชื่อมต่อสีเขียว และอีก 3 ชุมชน เป็นพื้นที่นำร่องและต่อยอดงานด้านพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายใน 4 อำเภอ ซึ่งได้แก่ อ. เมือง ศรีวิไล บุ่งคล้า บึงโขงหลง และเซกา

- 3 ชุมชน เป็นแหล่งนำร่องด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่
  - บ้านบุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า
  - บ้านห้วยเล็บมือ อ. บุ่งคล้า
  - บึงโขงหลง (พื้นที่ชุ่มน้ำ) อ.บึงโขงหลง
- 6 ชุมชน เป็นพื้นที่นำร่องในการฟื้นฟูป่าและแนวเชื่อมต่อสีเขียว
  - บ้านใหม่ชมพู อ.ศรีวิไล
  - บ้านทรายทอง นาสิงห์ อ.ศรีวิไล

- บ้านนาเจริญ อ.เมือง
- บ้านนาสวรรค์ อ.เมือง
- บ้านโคกก่องใต้ อ.เมือง
- บ้านเชียงเครือ อ. เซกา

ได้มีการปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชนในพื้นที่นำร่อง ได้มีการกำหนดกิจกรรมหลักและเป้าหมายในการดำเนินการโครงการร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งเป็นการรับรองในความร่วมมือในการดำเนินโครงการร่วมกัน ในช่วงปลายปี ๒๕๖๓ โครงการได้มีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญระดับชาติและระดับท้องถิ่นในการสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมีการพัฒนาเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ และมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการดังนี้

โครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย มีพื้นที่ปฏิบัติการที่จังหวัดบึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ

- เพิ่มแนวเชื่อมต่อสีเขียวเพื่อเชื่อมโยงผืนป่าโดยการฟื้นฟูป่าไม้ และความร่วมมือในการจัดการป่าไม้ และทำงานร่วมกัน โดยมีชุมชนเป็นฐาน
- พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่โครงการ โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิสาหกิจผลผลิตจากป่าที่สอดคล้องและบูรณการกับการจัดการป่าไม้ และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
- เพิ่มขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนเพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอในการจัดการระบบนิเวศป่าไม้แบบบูรณการและสอดคล้องกับการพัฒนาการดำรงชีวิตของชุมชน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ที่ยังต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๓ และมีการระบาดในระลอกที่ ๓ ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๔ ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยที่มีความรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาถึงปัจจุบัน และสถานการณ์ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบต่อการดำเนินงานของโครงการที่ต้องชะลอการดำเนินงานและกิจกรรมหลายกิจกรรมที่ต้องเลื่อนออกไป รวมถึงการเดินทางลงพื้นที่ในจังหวัดบึงกาฬก็ไม่สามารถปฏิบัติการได้ ด้วยการประกาศภาวะฉุกเฉินและข้อบังคับในช่วงการระบาดของโควิดทั้งในกรุงเทพและจังหวัดบึงกาฬ ดังนั้นในช่วงระยะเวลาสามเดือนตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่โครงการได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมและตกลงร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมในการฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในช่วงต้นเดือนเมษายนเพียงครั้งเดียว หลังจากรัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติการด้วยประกาศของจังหวัดและชุมชนไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่หรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้ ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ ในช่วงสามเดือนที่ผ่าน ต้องมีการปรับแผนและเลื่อนออกไป แต่อย่างไรก็ตามโครงการได้มีการจัดเตรียมแผนกิจกรรมต่างๆ เพื่อดำเนินการหลังการประกาศเปิดจังหวัดและให้มีการเดินทางเข้าจังหวัดได้ ซึ่งจะได้กล่าวในแผนงานต่อไป

๒. การดำเนินกิจกรรมโครงการฯในช่วงเวลา เมษายน –มิถุนายน ๒๕๖๔

๒.๑ การบริหารจัดการโครงการ

- จัดทำรายงานไตรมาตรเดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔ และได้นำเสนอต่อกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และกระทรวงการต่างประเทศ และได้จัดทำรายงานกิจกรรมและการเงินเสนอต่อแหล่งเงินทุน “กองทุนพิเศษภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงลานช้าง”
- จัดประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการผ่านการประชุมออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งพบว่าด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด-๑๙ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชน เพราะทางจังหวัดไม่อนุญาตในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ และชุมชนเองก็ไม่สะดวกใจในการที่จะให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการติดตามสถานการณ์ชุมชนและสื่อสารกับชุมชนผ่านสื่อไลน์กลุ่ม นอกจากนั้น ได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญในการปรับกิจกรรมและกำหนดแผนงานใหม่ เพื่อรองรับหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ผู้นำชุมชนบ้างท่านก็ยังถามถึงว่าเมื่อใดทางโครงการจะเข้าไปดำเนินกิจกรรมต่อไป ซึ่งทำให้ได้มีโอกาสพูดคุยกับชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ
- ลงพื้นที่ปฏิบัติการในช่วง วันที่ ๗-๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อติดต่อประสานงานกับศูนย์ป่าไม้จังหวัดและสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ในการปฏิบัติการและดำเนินการโครงการฯ ในระยะต่อไป รวมถึงการประสานงานเพื่อเป็นการจัดการอบรมต่างๆ ตามแผนงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนั้น ได้มีการติดตามและเข้าร่วม ในกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และได้มีการประชุมชี้แจงความเป็นมาของโครงการและแผนงานต่างๆ และได้มีการประชุมร่วมกันและสร้างข้อตกลงร่วมกันในการที่จะร่วมมือในการฟื้นฟูพื้นที่ ที่มีการทำลายป่าและป่าเสื่อมโทรม ซึ่งชุมชนเองได้ให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ
- มีการเตรียมการและพัฒนาโครงการฝึกอบรมใน ๓ หัวข้อ ซึ่งประกอบด้วย การจัดการไผ่เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของชุมชน การจัดทำแผนการจัดการป่าอย่างยั่งยืน และการเป็นวิทยากรกระบวนการอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งได้ทำแผนการอบรมและหลักสูตรแล้วเสร็จ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ดีขึ้น และมีการอนุญาตให้มีการเดินทางข้ามจังหวัดก็เริ่มดำเนินการทันที
- เสนอการว่าจ้างผู้ประสานงานในพื้นที่ดำเนินการของโครงการและติดต่อกับชุมชนและทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นซึ่งได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
- เสนอเพื่อขออนุมัติจัดซื้อกล้าไม้ที่จำเป็นและหายากเพื่อแจกจ่ายให้ชุมชนในพื้นที่โครงการเพื่อการฟื้นฟูในเขตป่าที่ชุมชน ได้นำเสนอและแสดงความจำนงในการฟื้นฟูป่าและขยายพื้นที่

แนวเชื่อมต่อสีเขียวต่อไป ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติและได้มีการจัดซื้อเป็นที่เรียบร้อย และอยู่ในระหว่างการสำรวจพื้นที่ในการจัดแจกกล้าไม้ต่อไป

- จัดทำและปรับแผนกิจกรรมและงบประมาณในไตรมาตรต่อไป

๒.๒ การดำเนินการกิจกรรมและแผนปฏิบัติการโครงการ

จากที่ได้รายงานมาข้างต้น ถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ กลับมาเป็นระลอก ๓ มีผลต่อสถานการณ์โดยรวมของประเทศไทย และประชาชนโดยรวม กิจกรรมต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนงาน ต้องมีการเลื่อนออกไปและด้วยข้อกำหนดและการประกาศของรัฐบาล ดังนั้น การดำเนินงานประชุมและการเดินทางทั้งภายในกรุงเทพและต่างจังหวัด ไม่สามารถทำได้ตามแผน อย่างไรก็ตามโครงการได้มีการติดตามสถานการณ์พื้นที่โดยตลอดและมีการปรึกษาหารือพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคลเพื่อการปรับแผนกิจกรรมต่างๆเมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้น

อย่างไรก็ตามทีมงานและผู้เชี่ยวชาญได้พยายามดำเนินงานตามแผนให้มากที่สุดเท่าที่สามารถดำเนินการได้ และได้มีการปรับกิจกรรมและทำแผนเร่งด่วนในการดำเนินงาน แต่อย่างไรก็ตามได้มีการสื่อสารและมีกำหนดการที่ชัดเจน ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์และผลลัพธ์	**กิจกรรม**	**สถานภาพกิจกรรม**	**แผนการดำเนินงานในกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔**
วัตถุประสงค์ ๑: เพิ่มแนวเชื่อมต่อสีเขียวเพื่อเชื่อมโยงผืนป่าโดยการฟื้นฟูป่าไม้ และการจัดการป่าไม้ ด้วยการทำงานร่วมกับชุมชน			
ผลลัพธ์ ๑.๑ ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ของพื้นที่สาธิตที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าไม้, ระบบนิเวศป่าไม้และทรัพยากรน้ำ และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม และมีการนำไปเผยแพร่ในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญและให้เป็นข้อมูลสาธารณะในการค้นหาและนำไปประยุกต์ใช้	๑.๑.๑ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและการ ตรวจสอบข้อมูลและจัดระบบข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อเป็นการใช้ในการจัดทำดำเนินการและติดตามในพื้นที่ป่าแนวเชื่อมต่อ	**๒+** ได้มีการสำรวจและเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และการประเมินชุมชนแล้ว กำลังอยู่ระหว่างการเขียนรายงาน	ส่งรายงานและนำเสนอต่อชุมชนภายใน สิงหาคม หรือหลังจากอนุญาตลงพื้นที่ ๑ เดือน
	๑.๑.๒ จัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการและศูนย์กลางข้อมูลสำหรับการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์และการเผยแพร่	**๐** ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำภายใน ตุลาคม

ผลลัพธ์ ๑.๒ การฟื้นฟูป่าแบบบูรณการและการสร้างแนวเชื่อมต่อพื้นที่ป่าและการพัฒนาแผนการจัดการร่วมกัน	๑.๒.๑ จัดทำแผนที่การใช้ที่ดินและการจัดทำแนวเขตโดยความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญเพื่อการฟื้นฟูป่าแบบผสมผสานและแผนการดำเนินการจัดทำแนวเชื่อมต่อพื้นที่ป่า	**๒** อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีการออกแบบแต่ยังไม่ได้ลงสำรวจกับชุมชน แต่ชุมชนได้มีการสำรวจเองระดับหนึ่ง	ต้องลงพื้นที่และแผนที่ต้องเสร็จภายในตุลาคม
	๑.๒.๒ สนับสนุนการสร้างเรือนเพาะชำชุมชนเพื่อรวบรวมเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกป่าฟื้นฟูและเพิ่มแนวเชื่อมต่อพื้นที่ป่า	**๒** ได้มีการดำเนินการใน ๒ ชุมชน ทำเรือนเพาะชำและเรียนรู้เรื่องการเพาะเมล็ดกล้า	เริ่มปรึกษาหารือกับชุมชนในการเริ่ม อีก ๒ ชุมชนภายในธันวาคม
ผลลัพธ์๑.๓ การสาธิตการฟื้นฟูปลูกป่าแบบผสมผสาน การสร้างแนวเชื่อมต่อสีเขียวและมีการฝึกปฏิบัติการสร้างแนวเชื่อมต่อพื้นที่ปา	๑.๓.๑ การเตรียมต้นกล้าเพื่อการฟื้นฟูป่าแบบผสมผสานและการสร้างแนวเชื่อมต่อพื้นที่ป่า	**๒+** ได้มีการเริ่มและอบรมในการเพาะกล้าไม้ใน ๒ ชุมชน และเริ่มปลูกในพื้นที่ที่ชุมชนเตรียมไว้	ควรเสร็จการลงกล้าไม้และเพาะพันธุ์กล้าเพิ่มอีก ๒ ชุมชนภายในเดือน ธันวาคม
	๑.๓.๒ การเตรียมที่ดินสำหรับการสร้างแนวเชื่อมต่อพื้นที่ป่า การสาธิตปลูกไม้ใช้สอย ป่าไม้เศรษฐกิจ เป็นแนวเชื่อมต่อป่าภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน	**๑** ได้เริ่มสำรวจและค้นหาครอบครัวที่จะเข้าร่วม	๔ -๖ ครอบครัวเข้าร่วมและเริ่มกิจกรรมภายในปี ๒๕๖๔
ผลลัพธ์ ๑.๔ การฟื้นฟูป่าแบบบูรณการและการสร้างแนวเชื่อมต่อพื้นที่ป่า การจัดการเทคโนโลยีและการจัดทำคู่มือทางเทคนิค	๑.๔.๑ สรุปประสบการณ์และเทคโนโลยีในการฟื้นฟูป่าแบบบูรณการและแนวทางปฏิบัติในการสร้างแนวเชื่อมต่อพื้นที่ป่าและการจัดทำคู่มือในด้านเทคนิคในการฟื้นฟูป่าแบบบูรณการฯ	**๐** ยังไม่ได้เริ่มในการสรุปบทเรียน	ข้อมูล ๖ ชุมชนจะมีการพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กเพื่อใช้ประกอบในการสัมมนาปลายปี

วัตถุประสงค์ ๒: เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่โครงการโดยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิสาหกิจป่าไม้ที่สอดคล้องกับการจัดการป่าไม้ และการจัดการระบบนิเวศอย่างยั่งยืน			
ผลลัพธ์ ๒.๑ มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยงเชิงนิเวศที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน	๒.๑.๑ จัดทำระบบฐานข้อมูลการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นไปที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิสาหกิจป่าไม้ และการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง	**๑** ได้มีการเตรียมการและติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการจัดเก็บข้อมูล	มีการเก็บข้อมูลใน ๓ ชุมชน และจัดทำรายงาน ภายในธันวาคม
ผลลัพธ์ ๒.๒ มีแผนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนโดยการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	๒.๒.๑ การออกแบบแผนพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน รวมถึง“แผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแผนปฏิบัติการ” และ“แผนพัฒนาวิสาหกิจป่าไม้” และมีการสาธิตอย่างเป็นรูปธรรม(กิจกรรม)	**๒** มีการดำเนินการในจัดอบรมเชิงปฏิบัติในการทำแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แต่ยังต้องดำเนินการอีกเพื่อจะโยงกับวิสากิจชุมชน	มีการประชุมแนะนำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระดับจังหวัด ภายในธันวาคม
	๒.๒.๒ การอบรมดูงานและการเสริมทักษะแก่ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการพัฒนาวิสาหกิจป่าไม้”	**๒** ได้มีการจัดอบรมในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ๒ ครั้ง	ต้องเลื่อนไปเป็นปี ๒๕๖๕
วัตถุประสงค์ ๓: เพิ่มขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนเพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอในการจัดการระบบนิเวศป่าไม้แบบผสมผสานและการพัฒนาการดำรงชีวิตของชุมชน			
ผลลัพธ์ ๓.๑ ขีดความสามารถของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในพื้นที่โครงการ เพิ่มขึ้นในเรื่องการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การบรรเทาความยากจนโดยพึงพิงทรัพยากรป่าไม้ผ่านการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนความรู้ และการศึกษาดูงาน	๓.๑.๑ มีการประเมินความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนในท้องถิ่นการพัฒนาหลักสูตรในการเสริมสร้างสมรรถนะ (CAB)เกี่ยวกับการจัดการระบบนิเวศป่าไม้และหัวข้อที่เกี่ยวข้องเช่น SFM การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้น	**๒+** ได้มีการประเมินเชิงพื้นที่แล้ว และอยู่ในระยะเวลาในการเขียนรายงานและจัดทำหลักสูตร	รายงานการประเมินความต้องการในการเสริมสร้างศักยภาพจะแล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม

	๓.๑.๒ จัดฝึกอบรมตามการประเมินความต้องการ CAB ที่เกี่ยวข้องกับ SFM และที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากป่า และศึกษาดูงาน	**๑+** จัดทำแผนการอบรมและหลักสูตรแล้วเสร็จ แต่ด้วยสถานการณ์โควิด จัดยังไม่สามารถดำเนินการอบรมตามแผน	มีการอบรม ๓ หัวข้อ ใน ๒๕๖๔ ๑.การจัดการไผ่กับความยั่งยืนในความเป็นอยู่ของชุมชน ๒. การจัดทำแผนการจัดการป่าอย่างยั่งยืน ๓. การเป็นวิทยากรกระบวนการอย่างมีส่วนร่วม
	๓.๑.๔ พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายป่าชุมชนที่เข้มแข็งในพื้นที่โครงการและเชื่อมโยงกับเครือข่ายระดับชาติและเครือข่ายการจัดการไฟป่า	**๒** ได้มีการดำเนินการประชุมเครือข่ายและจัดอบรมให้การศึกษาตามแผนงาน และจะต้องมีการประชุมอีกตามแผนที่กำหนดไว้	มีการประชุมเชิงปฏิบัติการอีก ๒ ครั้ง เพื่อสะท้อนข้อมูลให้ชุมชนและการค้นหาหมู่บ้านป้องกันไฟป่าอย่างครบวงจร
ผลลัพธ์ ๓.๒ มีการนำพื้นที่สาธิตไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านภายใน GMS ผ่านการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน และการฝึกอบรม	๓.๒.๑ จัดสัมมนาประจำปีของโครงการสำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ บทเรียนที่ได้เรียนรู้	**๑** มีการเตรียมการในรูปแบบและกระบวนการจัดสัมมนา	มีการจัดสัมมนาสรุปงานโครงการในจังหวัด ในเดือนธันวาคม
	๓.๒.๒ สนับสนุนสมาชิก PSC และ PPSC ให้เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในเวทีระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติและการประชุมการแบ่งปัน (แลกเปลี่ยนการเยี่ยมชมการศึกษาไปยังพื้นที่โครงการ ๒ GMS อื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้จากที่อื่น ๆ	**๐** ด้วยสถานการณ์โควิดไม่สามารถดำเนินการได้	อาจต้องเลื่อนออกไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

หมายเหตุ
๐ = ยังไม่ได้เริ่มกิจกรรม, ๑ = เพิ่งเริ่ม และยังไม่ได้มีการดำเนินการกิจกรรม
๒ = กิจกรรมที่กำลังมีการดำเนินการ , ๓ = กิจกรรมมีการดำเนินการและกำลังแล้วเสร็จ

๓. รายงานการเงินและงบประมาณ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก MLC	งบประมาณ (ปี ๒๕๖๔)	รายจ่าย	คงเหลือ
การเตรียมต้นกล้าเพื่อการฟื้นฟูป่าแบบผสมผสานและการสร้างแนวเชื่อมต่อพื้นที่ป่า	กิจกรรม ๑.๓.๑	๙๙,๙๕๐.๐๐	
ผู้ประสานงานพื้นที่ในการเพิ่มพื้นที่เชื่อมต่อสีเขียว (เมษายน-พฤษภาคม)	กิจกรรม ๑.๓.๒	๒๑,๐๐๐.๐๐	
ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาเครือข่ายชุมชนฯ	กิจกรรม ๓.๑.๓	๑๘๗,๕๐๐.๐๐	
การประชุม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การแนะนำโครงการและการเตรียมการ	หมวดที่ ๔.๑ การประชุม PSC และทีมงาน	๗๗๐.๐๐	
การบริหารจัดการโครงการ (ผู้จัดการและการเงิน/บัญชี/งานธุรการ)	หมวดที่ ๔.๓ งบประมาณสำหรับพนักงานโครงการ	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	
อุปกรณ์ และ วัสดุในการปฏิบัติการในสำนักงาน	หมวดที่ ๔.๔ งบประมาณในการดำเนินโครงการ	๖๓,๘๘๕.๔๒	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (การเดินทางเพื่อการติดตามงาน)	หมวดที่ ๔.๕ งบประมาณในการดำเนินโครงการ	๒๙,๒๑๐.๐๐	
ค่าใช้จ่ายเดือน เมษายน–มิถุนายน ๒๕๖๔	-	**๖๘๑,๓๑๕.๔๒**	
ค่าใช้จ่ายเดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔	-	**๑,๐๖๘,๘๓๙.๐๐**	
งบประมาณในปีที่ ๒ (๒๕๖๔) คงเหลือรวม	**๔,๙๐๗,๑๐๐.๐๐**	**๑,๗๕๐,๑๕๔.๔๒**	**๓,๑๕๖,๙๔๕.๕๘**

๔. บทส่งท้ายและความท้าทาย

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ที่ยังไม่สามารถควบคุมทั้งในระดับสากลและระดับชาติ ซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญกับการระบาดรอบ ๓ และมีสถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้น รัฐบาลมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทำงานที่บ้าน เพื่อป้องกันการระบาด ในช่วงเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายน มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นและยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ดังนั้นในช่วง ๑-๒ เดือนข้างหน้า ก็ยังคาดว่าสถานการณ์จะยังไม่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามทีมงานและผู้เชี่ยวชาญได้มีการเตรียมความพร้อม ในเรื่องการอบรมและประชุมเครือข่ายชุมชน เมื่อมีการประกาศให้ได้มีการเดินทางข้างจังหวัดได้

- สำหรับงบประมาณนั้น จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะได้จ่ายให้กับทีมผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาไปแล้ว ๒ งวด และจะจ่ายอีกครั้งเมื่อมีการส่งงานตามสัญญา แต่อย่างไรก็ตามในการดำเนินกิจกรรมนั้นจะล่าช้าและการส่งมอบงานจะถูกขยายเวลาออกไปประมาณ ๓ เดือน หรือจนกว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ จะดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผล ตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อชุมชนให้มากที่สุด `
- กิจกรรมในการจัดอบรมต่างๆ และการทำงานในพื้นที่ต้องเลื่อนออกไป ซึ่งอาจเป็นผลให้กิจกรรมบางกิจกรรมอาจล่าช้ามากขึ้น
- ในช่วงระยะเวลาข้างหน้าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ทีมงานจะต้องลงพื้นที่มากขึ้น เพื่อเตรียมการอบรมและการติดต่อประสานในระดับจังหวัด และเร่งขับเคลื่อนกิจกรรมที่ได้การปรับและเลื่อนออกมา

๕. เอกสารแนบ

๕.๑ ตารางสรุปกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการในช่วงปีที่ ๒ ไตรมาตรที่ ๒ (เมษายน –มิถุนายน๒๕๖๔)

โครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย
สนับสนุนโดยกองทุนพิเศษภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตารางสรุปกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการในโครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย

ที่	วัน เดือนปี	กิจกรรมและรายละเอียด	วัตถุประสงค์	สถานที่จัดกิจกรรม	จำนวน ผู้เข้าร่วม ใน กิจกรรม		ผู้รับผิดชอบ
					ชาย	หญิง	
๑	๕ – ๑๒ เม.ย ๖๔	-ลงพื้นที่ชุมชนหลักฯของโครงการใน ๕ ชุมชนเพื่อเตรียมการฝึกอบรม จำนวน ๓ หลักสูตร คือการจัดการไผ่ การจัดทำแผนการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเป็นวิทยากรกระบวนการ -พบกับ ทสจ บึงกาฬ เพื่อประสานงานในการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและประสานงานเพื่อการจัดอบรมฯ	-ติดตามงานโครงการฯ - เตรียมการฝึกอบรม จำนวน ๓ หลักสูตร คือการจัดการไผ่ การจัดทำแผนการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเป็นวิทยากรกระบวนการ	บ้านใหม่ชมภู บ้านทรายทอง บ้านนาเจริญ บ้านนาสวรรค์ บ้านท่าเชียงเครือ			ผู้จัดการโครงการ, เจ้าหน้าที่จากศูนย์วนศาสตร์ชุมชน สกลนคร ๒ ท่านและทีมงาน
๒	เม.ย. ๖๔	จ้างเหมาผู้ประสานงานในพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานในพื้นที่โครงการ	จ. บึงกาฬ			
๓	๑๒ พ.ค. ๖๔	จัดซื้อกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ชุมชนนำร่อง	เพื่อเป็นการเสริมกล้าไม้ให้ชุมชนได้ปลูกป่าในฤดูฝน	พื้นที่โครงการฯ บึงกาฬ			ทีมผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน สกลนคร
๔.	๒ มิ.ย. ๖๔	ประชุมทีมที่ปรึกษาและทีมงานผ่านระบบออนไลน์	เพื่อการติดตามงานกับผู้เชี่ยวชาญรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน	กทม.			ดร.อรุณศรี หน.ปรีชา(สกลฯ) อัจจลา รัตติกา ผอ.ภาษกร ผอ. สภลฑ์ ผอ.ปรีชา ผจก.สมหญิง ศศิมา ผอ.เสกสรรค์
๕..	มิ.ย. ๖๔	ทีมฟื้นฟูป่าและแนวเชื่อมต่อสีเขียวได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามงาน (ไม่ได้ลงกิจกรรม)	รักษาความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานและเจ้าหน้าที่				ทีมศูนย์วนศาสตร์ชุมชน สกลนคร

๕.๒ รูปกิจกรรมต่างๆในช่วงเวลา เมษายน –มิถุนายน ๒๕๖๔

๑) การประชุมออนไลน์ ทีมงานและผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่๑/๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

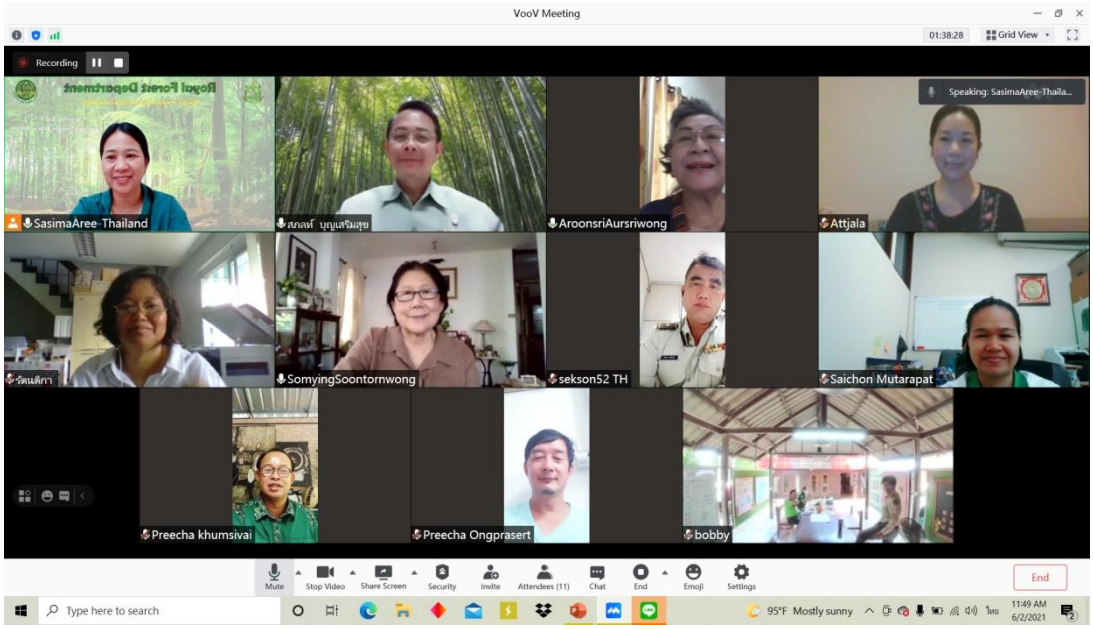

๒) การติดตามและประชุมปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชนและกรรมการป่าชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ ในช่วงในวันที่ ๕-๑๒ เมษายน ๒๕๖๔

๓) การปลูกและฟื้นฟูป่าในบริเวณที่ชุมชนได้เตรียมไว้ ตามแผนของชุมชนในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ การเพาะกล้าและการแจกจ่ายสนับสนุนให้กับชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ
